





شهزاده جورج ولسوالی عامه بنونه او روزانه . مشغول . دیزاین . جوړول . اړیکه . شهزاده جورج ولسوالی عامه بنونه او روزانه



ویلیم ویرت منځنی ښوونځی د پروژې د تازه معلوماتو غونډه |  
د اکتوبر ۳۰ مه، د ماښام ۶:۳۰ بجې



په پښتو ژبه په ورته وخت کې/همزمان ترجمه  
شتون لري



په کمپیوټر کې - د سکرین په ښکته برخه کې به د نړۍ نقشه تاسو گوری. په هغه نړۍ کلیک وکړئ او بیا پښتو غوره کړئ.



په موبایل کې -- د سکرین په ښکته برخه کې ښي خوا کې د بیضوي سمبول باندې کلیک و کړئ  
(....).



- د ژبو ترجمه انتخاب کړئ.
- پښتو انتخاب کړئ

مور ستاسو نظرياتو ته ارزښت ورکوو.

مهرباني وکړئ د زوم د پوښتنې او ځواب په ساحه

کې خپلې پوښتنې/نظرونه وليکئ.

د دې ښاروالۍ غونډۍ پوښتنې او ځوابونه به د

ښوونځي د پروژې په پاڼه کې په نشر شي.

[/https://offices.pgcps.org/cip](https://offices.pgcps.org/cip)



پوښتنې او ځوابونه لاس پورته کړی نظريات

## زمونږ ژمنه

- شهزاده جورج ولسوالی عامه تعلیمی اداره (PGCPS) زموږ د زده کونکو، بنوونکو او ټولنو لپاره د خوندي، عصري، او دوامداره زده کړې چاپیریال وړاندې کولو لپاره په چټکۍ سره حرکت کوي.
- د درې اړخیزې کرنلارې له لارې، د دودیزې پانگونې بڼه والی،
- د بیارغونې مرحلې، او د هیواد لومړی عامه بنوونځي P۳ ډیزاین - جوړونه - ساتلو طریقه، چې په بل ډول د آبی چاپ بنوونځي پروگرام په نوم پېژندل کیږي، موږ یوازې په ۱۰ کلونو کې د ۲۵ څخه ډیر عصري بنوونځي تاسیساتو وړاندې کولو په لاره کې یو.



## اجندا

د ټيم پيژندنه

د پروژې د کار مراحلو برسی/ بیاکتنه

د پروژې مهال ویش برسی/ بیاکتنه

ساختماني معلومات

پوښتنه او ځواب

## د ټيم پيژندنه

**د PGCPS د پلازميني پروگرامونو څانګه**

جيسن واشنگټن، د ملاتړي خدماتو مرستيال

شان ماتلوك، رييس

ويل سيمټ، د پروژې مديريت څارونكی

هينري ليويس، د پروژې مدير

**كربټري، روهرباګ او اسوشيتيټيس معماران**

سيت وينټز، د پروژې معمار

**كيلر ورونه**

جستين شاربټ، د پروژې اجرايوي

براد ماير، د پروژې مدير

كامرون اورواشيل، د پروژې مرستيال مدير

مايكل بيلي، ريس/سپرنټنډنټ

ټيلر جورولين، ريس معاون/سپرنټنډنټ





## د پروژې کارونه

په رپورټيل ، ميريلينډ کې د شهزاده جورج ولسوالۍ عامه ښوونځيو لپاره د ويليم ويرټ مينځني ښوونځي ځای په ځای کول. په دې پروژه کې د نوي ښوونځي ودانۍ جوړول، د ساحې اړوند کار، او د موجوده ښوونځي ويجاړول شامل دي. پروژه به په څلورو اصلي مرحلو کې ترسره شي چې عموماً به په ترتيب سره ترسره کيږي.




## پروژې کارونه

### د پروژې پړاوونه

**په 1 مرحله کې** د موجوده مایډل ټولګیو ځای په ځای کول، د خاورو او تخریب کنټرول نصبول، د نوي ښوونځي ودانۍ ته د نويو اسانتیاوو نصب کول، او د ساحې ځینې کارونه شامل دي.

**په ۲ مرحله کې** د ښوونځي د نوي ودانۍ جوړول شامل دي او د لومړي پړاو د ساحې د کار د پرمختګ سره په ګډه جوړیږي. د نوي ښوونځي او د نوي ودانۍ سره نږدې د لومړي پړاو ساحې کار بشپړولو سره، مالک کولی شي د نوي تاسیساتو څخه ګټه پورته کړي او د ښوونځي موجوده ودانۍ خالي کړي.

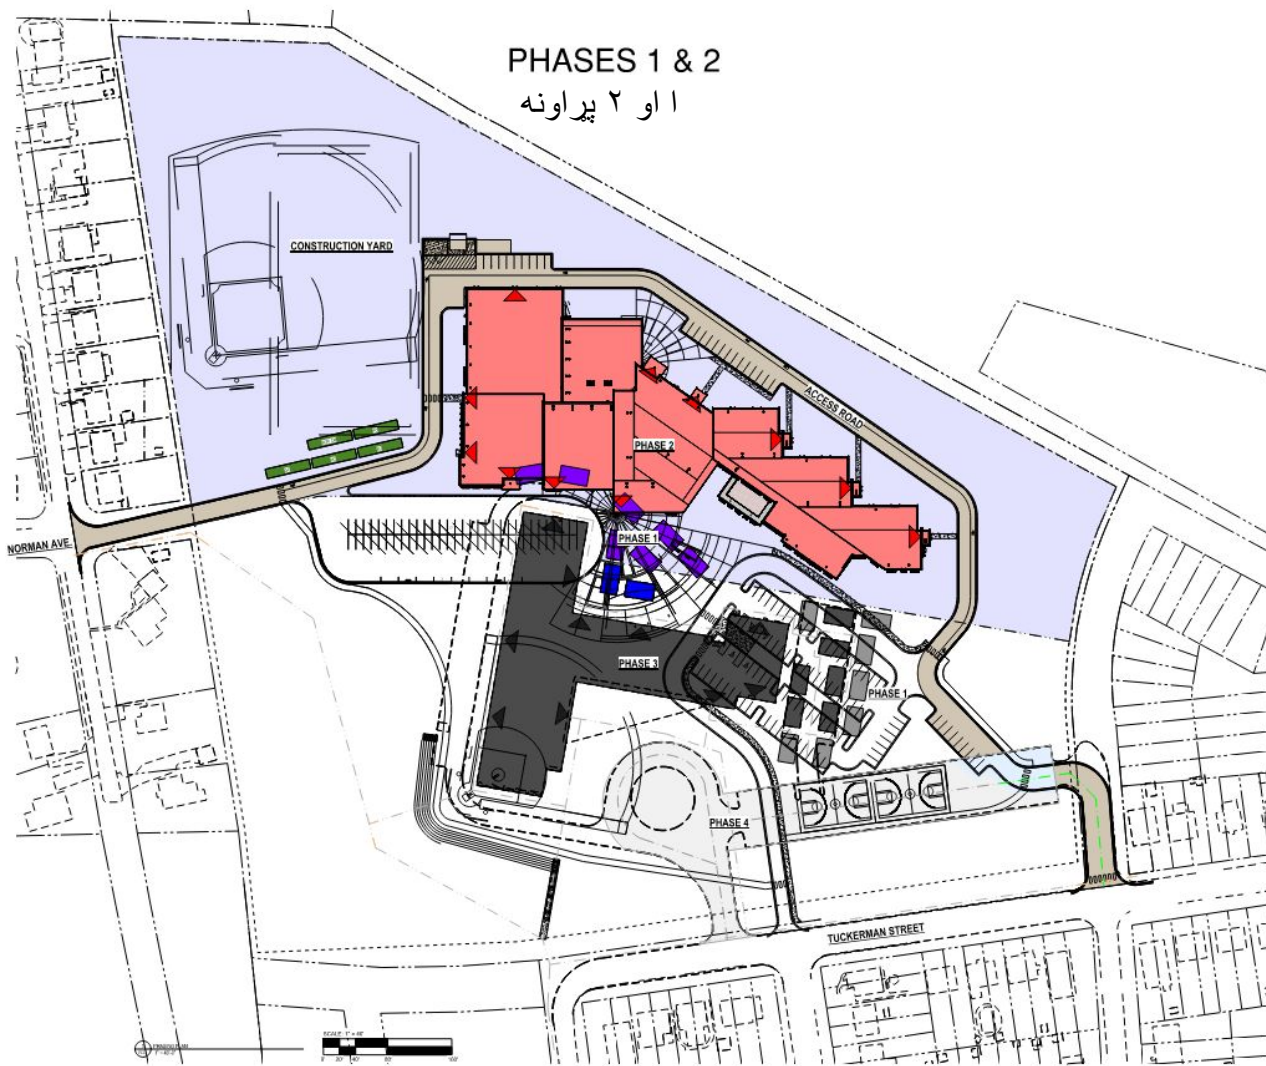


## پروژې کارونه

### د پروژې پړاوونه

په ۳ مرحله کې د اسانتیاوو منحل کول او د موجوده ښوونځي ودانۍ ویجاړول شامل دي.

په ۴ مرحله کې د ساحې د ټولو کارونو بشپړول شامل دي په شمول د طوفان د اوبو سیستم نصب کول، د بایو ساتلو جوړښتونه، د نوي توپ میدان، د امفیتیتیر څوکی، د نوي بس حلقه، د نوي پاڅه شوي ساحې لوبې میدان، او د نوي موټر تم ځای. ټکر من سرک ته لاسرسی.

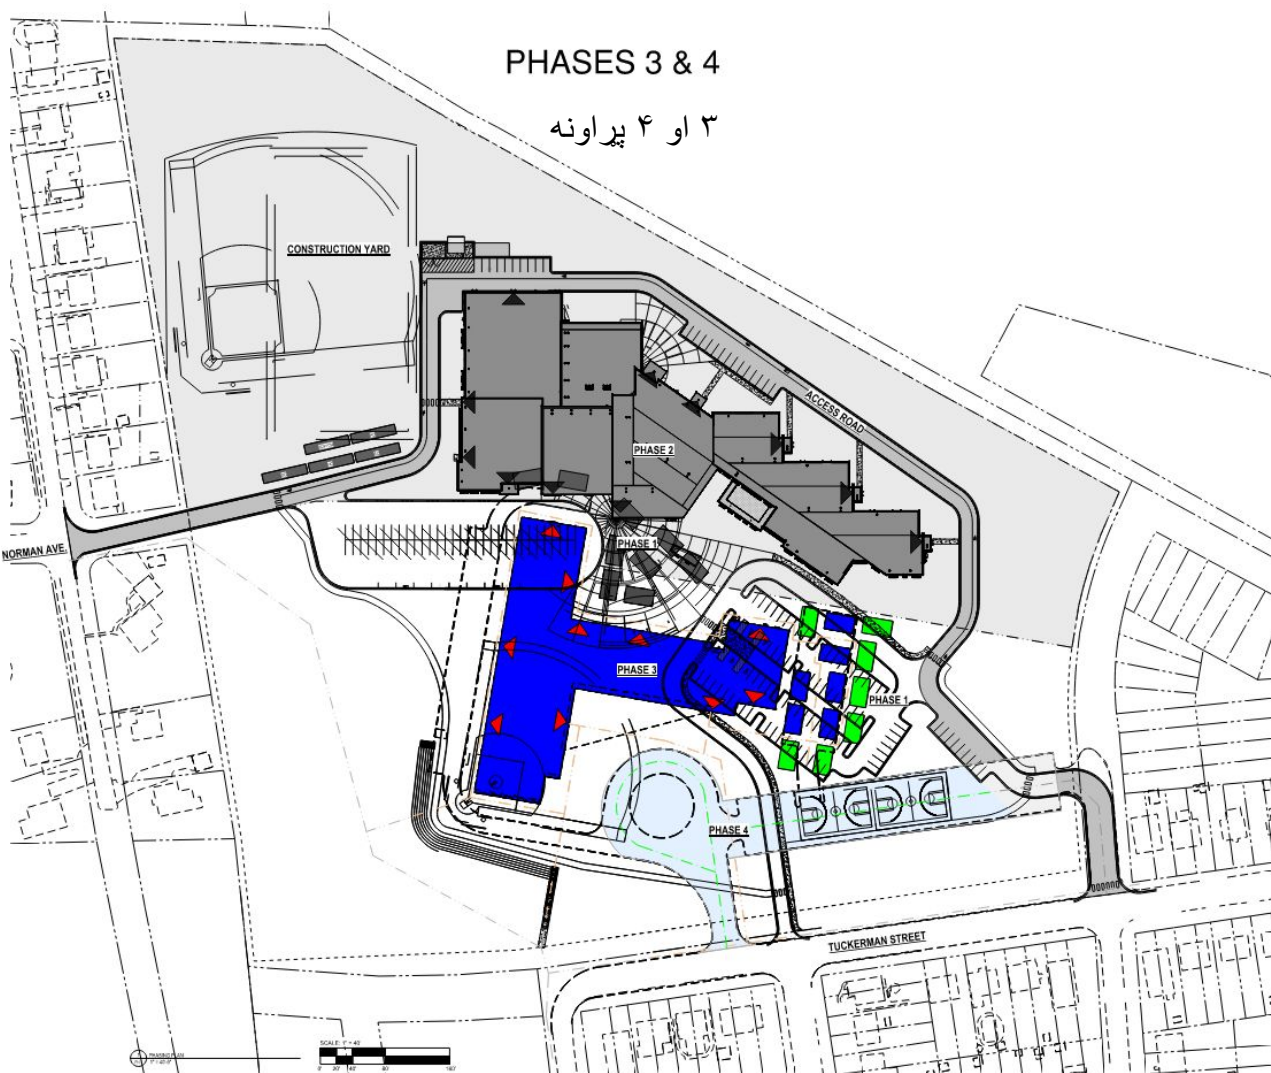

## د ساحې پلان



## د پروژې کارونه



د لومړي پور عمومي محل

## د پروژې کار



## د پروژې کار



طعام خانه/کيفيتيريا



عادي ټولگي

## د پروژې کار



د همکارى محل



دوهم پور لابی/دهلیز

## د پروژې مهال ویش

دایمي انرژي/بریننا	نوامبر ۲۰۲۳
۱ پړاو د پام وړ بشپړول	اگست ۲۰۲۳
۲ پړاو د پام وړ بشپړول	اپریل ۲۰۲۴
۳ پړاو د پام وړ بشپړول	اگست ۲۰۲۴
۴ پړاو د پام وړ بشپړول	جنوری ۲۰۲۵
وروستی بشپړول/تکمیل	پسرلی ۲۰۲۵



## ساختماني کتنه/بررسی

راتلونکې مراحل/قدم	کار روان دی	لوی بشپړ شوی کارونه
د کمپسیون فعالیتونه.	داخلي چارې پیل شوي.	ساختماني فولاد او چت نصب کول.
په ټوله ودانۍ کې د تجهیزاتو پیل.	MEP د چت څخه پورته کارونه اوس روان دي.	سویچ گیر نصب شوی، او د پیپکو د دایمي بریښنا په تمه
داخلي کارونه ته دوام ورکوی.	د فرش چمتو کول او د VCT نصب کول پیل شوي.	په دیوال کې بریښنایی او د نلدوانی غزوال
د لفت تنظیم کول او توازن برابرول	داخلي رنگ کارونه روانه ده.	د اوبو شیندلو نصبول
د دیوال پردو لگول	د ساحی کار روان دی.	بیرونی او د داخلي نما ډبرو لگول
	د چت نصبول دوام لري.	د چت د تجهیزاتو پردو/سکرینونو نصب کول.

## ساختماني کتنه/بررسی



ډرون هوایي تصویر

## ساختمان کتنه/بررسی




بیررني فلزي تختې



بیروني فلزي تختې

## ساختمان کتنه/بررسی

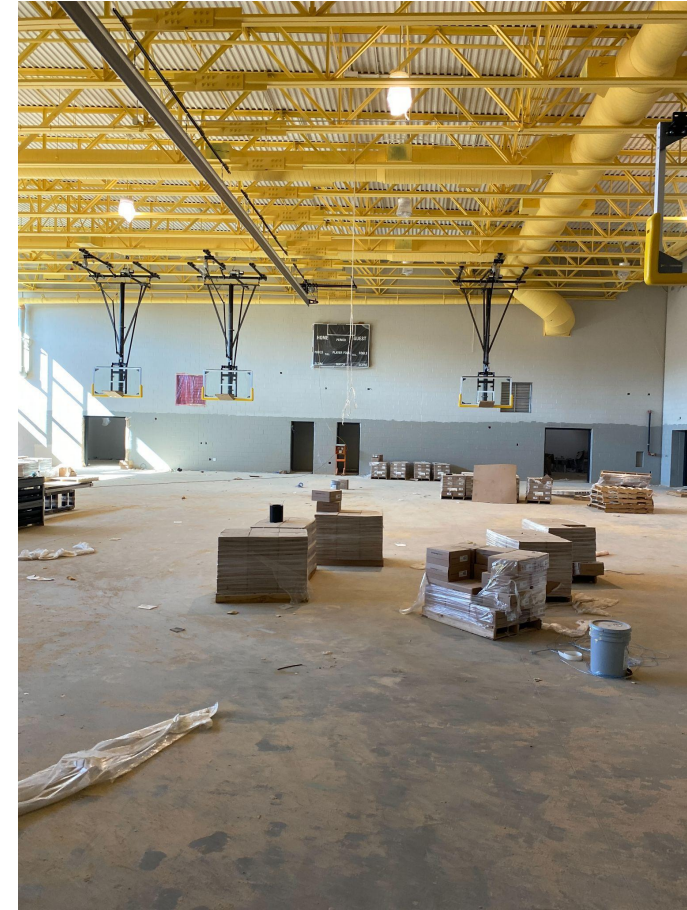

فلزي تختې

بدن بڼکله خونه

## ساختمان کتنه/بررسی



ټولگی



ټولگی

## ساختمان کتنه/بررسی



د رسنیو مرکز



د کیس ورک نصب کول

## پوښتنه او ځواب

- مهرباني وکړئ د زوم د پوښتنې او ځواب په ساحه کې خپلې پوښتنې / نظرونه وليکئ.
- د دې بناوالی پوښتنې او ځوابونه به د ویليم ويرټ منځنی ښوونځی پروژې پاڼې په [www.pgcps.org/cip](http://www.pgcps.org/cip) کې نشر/وځړول شي.
- که تاسو اضافي پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ دوی ته برېښنا لیک وکړئ [capital.programs@pgcps.org](mailto:capital.programs@pgcps.org).



## له تاسو مننه!

د اضافي پوښتنو مطرح کولو او د نن ورځې پريزنټيشن ليدلو لپاره، ليدنه

وکړئ [www.pgcps.org/cip](http://www.pgcps.org/cip).
