




PGCPS . **ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER** . PGCPS



COLLÈGE WILLIAM WIRT

RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LE PROJET | 24 SEPTEMBRE 19H00





Interprétation simultanée

SPANISH :

El servicio de interpretación simultánea está disponible en español. Haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione Spanish (español).

ARABIC


الترجمة الفورية متوفرة باللغة العربية. اضغط على ايقونة الكرة الأرضية أسفل الشاشة وحدد العربية.

DARI

را انتخاب کنید. (ترجمه به دری) Dari تفسیر همزمان به زبان دری موجود است. روی نماد کره در پایین صفحه کلیک کنید و

PACHTOU


په پښتو کې یو شان تفسیر شتون لري. د سکرین په پای کې د گلوب عکس کلیک وکړئ او پښتو غوره کړئ. (په پښتو ژباړه)





Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du projet scolaire à bit.ly/DCP-WilliamWirt.



Notre engagement

PGCPS agit promptement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration traditionnelle du capital, les rénovations par étapes et la première approche de Conception-Construction-Entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.



Agenda

- Présentations des équipes
- Examen du calendrier du projet
- Examen de la portée et du phasage du projet
- Mise à jour sur la construction
- Questions et réponses

Présentations des équipes

Département des programmes d'investissement de PGCPS

- **Dr Charoscar Coleman**, *Directeur des opérations*
- **Jason Washington**, *Surintendant adjoint des services de soutien*
- **Shayla Jackson**, *Directrice*
- **Will Smith**, *Superviseur de la gestion du projet*
- **Henry Lewis**, *Responsable de projet*

Keller Brothers

- **Justin Short**, *Directeur de projet*
- **Alex Menke**, *Responsable de projet adjoint*

Crabtree, Rohrbaugh & Associates Architects

- **Seth Wentz**, *Architecte du projet*

Collège William Wirt

- **Rhonda Simley**, *Directrice*

Bureau des transports de PGCPS

- **Keba Baldwin**, *Directeur*



Calendrier du projet



Novembre 2023	Alimentation permanente
Août 2023	Phase 1 Achèvement substantiel
Juillet2024	Phase 2 Achèvement substantiel
AS 2024 - 2025	Déménagement et occupation du nouveau bâtiment
Janvier 2025	Phase 3 Achèvement substantiel
Juin 2025	Achèvement substantiel de la Phase 4
Juillet2025	Achèvement du projet final, y compris les travaux sur le site




Portée du projet

Phases du projet

La phase 3 consiste en la déconnexion des services publics et la démolition du bâtiment scolaire existant.


La phase 4 comprend l'achèvement de tous les travaux sur le site, y compris l'installation du système de gestion des eaux pluviales, des structures de biorétention, d'un nouveau terrain de jeu, de sièges d'amphithéâtre, d'une nouvelle boucle d'autobus, de courts de jeu nouvellement pavés, de clôtures et d'un nouveau parc de stationnement avec accès à

Tuckerman Street.

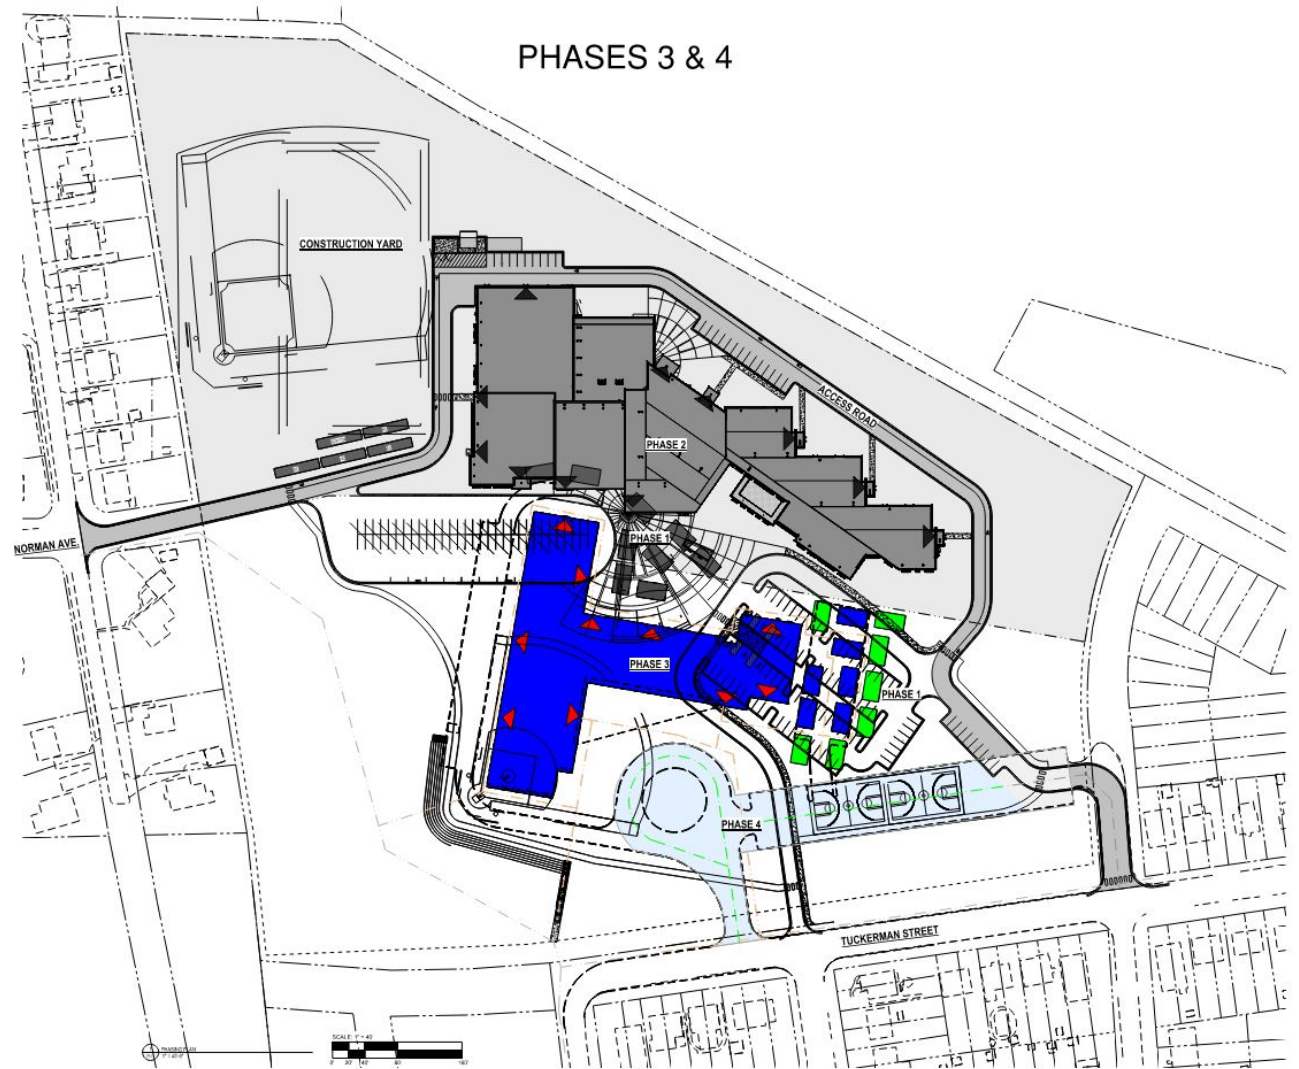

Questions et réponses

Portée du projet

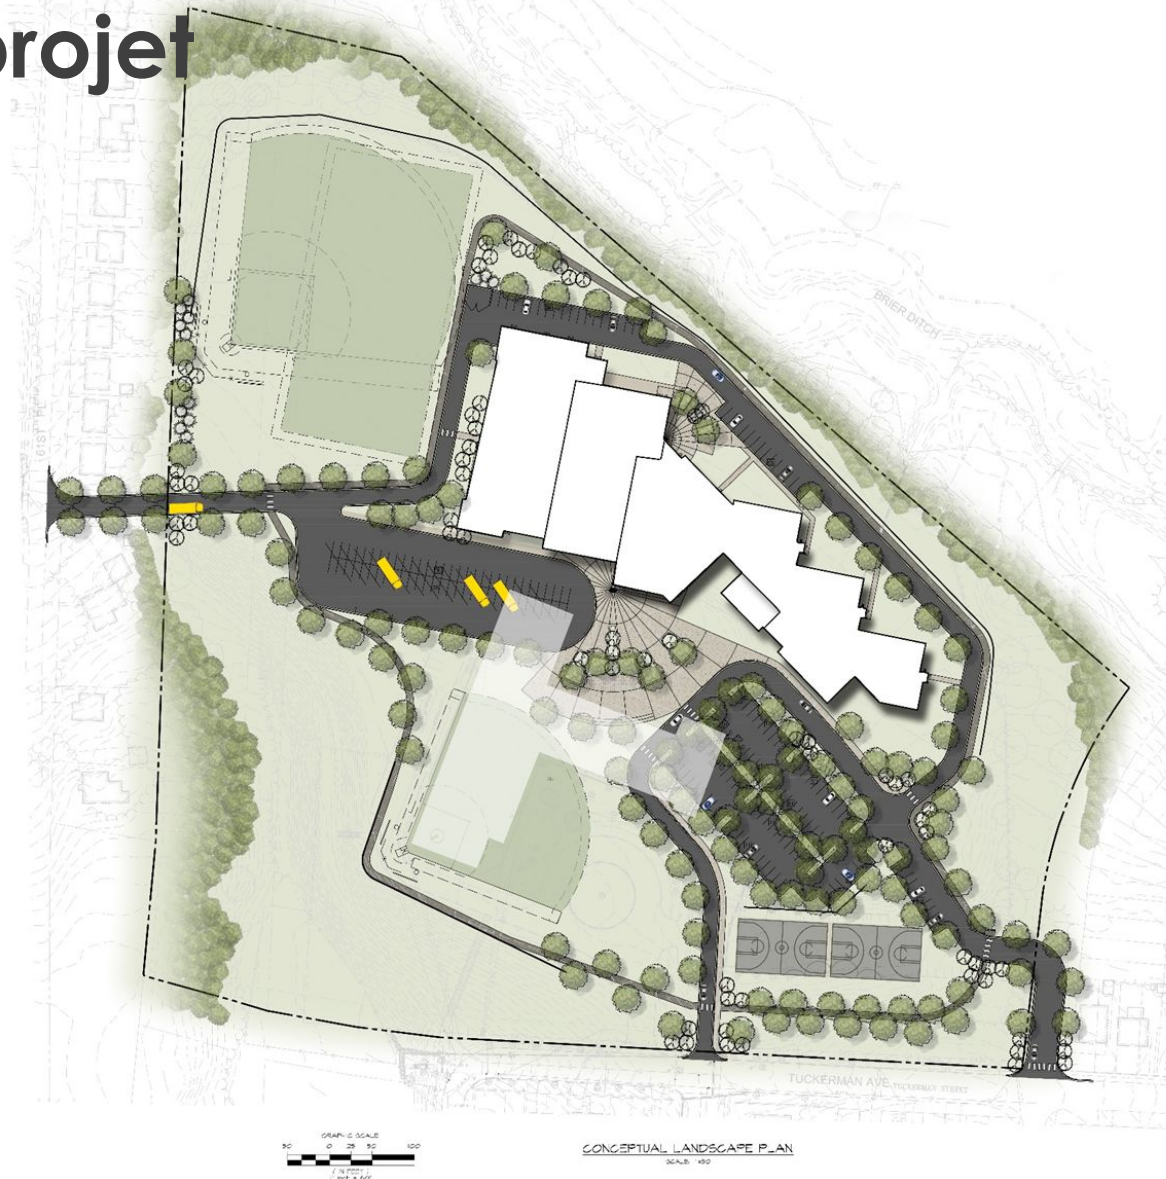

Plan du site

Questions et réponses



Portée du projet

GRAPHIC LEGEND

-  MAIN ENTRY / VISITOR ENTRY
-  SECONDARY ENTRY / BUS ENTRY
-  COMMUNITY USE ENTRY & PARKING
-  REAR ENTRY
-  BUS DROP-OFF
-  PARENT DROP-OFF
-  DELIVERIES
-  WASTE STORAGE
-  TRAFFIC GATE



Plan du site



Aperçu de la construction

Principaux travaux achevés	Travaux en cours	Prochaines étapes
L'occupation a été accordée et les élèves et le personnel utilisent pleinement la nouvelle école !	Installation d'un sol de gymnase	Achèvement de la phase 4 en juin 2024
	Démolition de l'ancienne école	Achèvement de la phase 4 du projet qui comprend la démolition de l'ancienne école, de plusieurs terrains de sport et de parkings à l'emplacement de l'école existante
	Installation de murs de soutènement et d'un terrain de baseball dans la zone d'étape de la construction	Achèvement définitif en juillet 2025
	L'installation des gradins se fera une fois que le sol du gymnase sera prêt et sec.	



Aperçu de la construction



Extérieur de l'entrée arrière



Peinture murale de la panthère WWMS



Aperçu de la construction



Peinture du sol du gymnase



Installation d'un nouveau gymnase

Aperçu de la construction



Préparation du site pour l'installation d'un mur de soutènement et d'un terrain de baseball



Nouvelle cafétéria

Questions et réponses

Questions et Réponses

Veillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.



Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la présentation d'aujourd'hui, consultez la page web du projet sur bit.ly/DCP-CoolSpring ou envoyez un email à capital.programs@pgcps.org.

Pour recevoir des mises à jour et les actualités de la part du Département, inscrivez-vous sur la liste de diffusion à bit.ly/DCP-Mailing ou scannez le code QR ci-dessous.

